



Rapport Final

Michel K. Saraka, Directeur Exécutif ARDPC, ardpcosc@gmail.com

Monique GRAH, Chargée de Programmes ARDPC, +225 5754 7238

Campagne de Sensibilisation Contre le VIH SIDA et l'Ebola



Avril 2016



Alliance pour la
Reconstruction et le
Développement
Post
Conflit

Transformer les Vies et les Nations
Plateforme contre le VIH-SIDA et l'Ebola (PVE)



LA BANQUE
MONDIALE



Projet d'Urgence de Renaissance des
Infrastructures en Côte d'Ivoire (PRICI)

Composante IV (Assainissement eaux usées), Baie de Cocody, Corniche

NOM DE L'ENTREPRISE



E. R. B
Entreprise Routes & Bâtiments
Curage et Faucardage sous eau



SOMMAIRE

VOLET NARRATIF	2
1. Contexte	3
2. Justification.....	3
3. Objectifs et résultats attendus	4
4. Analyse du contexte de la mise en œuvre	5
5. <u>Phase 1</u> : Mise en œuvre des activités :.....	6
6. <u>Phase 2</u> : Reprise des activités.....	7
7. Plan détaillé d'activités du projet.....	7
8. Plan de Suivi-Evaluation et de performance du projet.....	7
VOLET FINANCIER	12
9. Note introductive	13
10. Cadre de rendement	14
11. Facture Finale à Payer par ERB.....	17
12. DIFFICULTES RENCONTREES	22
13. RECOMMANDATIONS	22
14. CONCLUSION	22
15. ANNEXES	23
Photos	
Chronogramme Initial	
Chronogramme Effectif	
Liste initiale des Educateurs des Pairs	
Liste Effective des Educateurs des Pairs	

I. VOLET NARRATIF

RAPPORT FINAL

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LE VIH-SIDA ET L'EBOLA

1. CONTEXTE

L'Alliance pour le Développement et la Reconstruction Post-Conflict (ARDPC) a été heureuse de travailler avec l'Entreprise Routes et Bâtiments (ERB) et le PRICI dans le cadre de la **Campagne de Sensibilisation contre les IST-SIDA et l'Ebola**, à l'endroit du personnel de l'Entreprise ERB et des populations riveraines. Faisant partie des activités de l'entreprise ERB, la campagne de sensibilisation contre les IST-SIDA et l'Ebola, s'inscrit dans le cadre des activités du Projet d'urgence de renaissance des Infrastructures en Côte d'Ivoire (PRI CI), notamment en sa composante IV (Assainissement eaux usées) qui concerne les travaux de renforcement des ouvrages de drainage au carrefour de l'Indénié et d'aménagement de la baie de Cocody.

Le projet est localisé dans le District d'Abidjan. Il touche les Communes d'Adjamé, de Cocody et du Plateau. Dans la zone d'influence du projet, il est apparu que la vraie contrainte en matière de lutte contre les IST-SIDA et des épidémies telle l'EBOLA, est l'insuffisance de la sensibilisation/prévention. L'opinion selon laquelle, l'on ne court aucun risque de contracter ces maladies reste encore répandue chez une large portion de la population ; ce qui explique le faible niveau d'utilisation des préservatifs et de respect des consignes de protection recommandées par le ministère de la santé.

Par ailleurs, le projet, pendant sa réalisation a entraîné une concentration et un brassage de personnes, ayant parfois des coutumes et des habitudes très variées. Cela a constitué une source potentielle de risques de contamination. Pour cela, des actions de lutte contre les IST/SIDA et l'EBOLA ont été prescrites par le Maître d'Ouvrage. Il a donc été recommandé que sur le terrain, ces actions soient mises en œuvre par les entreprises par le biais d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) qu'elle recrutera.

En septembre 2014, l'ARDPC a soumissionné à l'appel à propositions lancé à cet effet. L'appel porte sur une campagne de sensibilisation contre les IST-SIDA et la maladie à Virus Ebola à l'intention du personnel de l'entreprise ERB et des populations riveraines du carrefour de l'indénié et de la baie de Cocody, dans le cadre du projet. L'ARDPC a remporté l'appel à propositions et a été sélectionné pour la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation.

La Campagne vise à faire prendre conscience aux employés de l'entreprise, aux usagers de la route, aux écoliers, aux populations riveraines de la zone des travaux, aux autorités locales et gouvernementales de la zone d'influence du projet de la nécessité de veiller sur leur santé et de se protéger contre les IST/SIDA et l'EBOLA. Le projet a été bénéfique à tous ces acteurs précités et a eu un impact positif en termes de contribution à la réduction des risques de contamination au VIH SIDA, et à l'Ebola. En définitive il a amélioré la santé et donc les variables socio-économiques dans la zone du projet.

2. JUSTIFICATION

La Côte d'Ivoire fait partie des pays au sud du Sahara les plus touchés par l'épidémie du VIH particulièrement en Afrique de l'Ouest. Selon l'EDS 2011-2012, la prévalence du VIH dans la population générale est de 3,7%. Elle est plus élevée chez les femmes (4,6%) que chez les hommes

(2,9%). Elle augmente avec l'âge aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Elle est plus élevée en milieu urbain (4,3%) qu'en milieu rural (3,1%). La ville d'Abidjan (5,1%), le Centre-Nord (4,4%), le Sud-ouest (4,3%), le Centre-Est (4%), ont les prévalences les plus élevées.

La propagation du virus Ebola qui frappe l'Afrique de l'ouest, depuis début 2014 s'est accélérée et les autorités sanitaires internationales qui projetaient pouvoir mettre fin à l'épidémie avant fin 2015 au moins, sont encore à la recherche de solutions devant les cas de nouvelles contaminations en 2016. L'épidémie a fait plus de 11 000 morts, sur plus de 24 350 personnes affectées. Au total six (6) pays sont touchés. Hormis la RDC, qui connaît des cas isolés d'Ebola, le Nigeria qui a contenu quelques rares cas, et le Sénégal, où un voyageur venant de Guinée a contracté le virus, trois pays où la flambée d'Ebola est la plus intense ; Guinée, Liberia et Sierra Leone ont compté au quotidien le plus grand nombre de morts et de victimes. L'OMS a annoncé la découverte récente d'un vaccin a pu a coup d'efforts et de solidarités internationales inverser la tendance de l'infection. Le montant d'aide nécessaire pour les pays touchés avait été estimé à plus de 600 millions de dollars. Si la CI a été épargnée jusque-là, cela est dû à l'effort particulier des autorités et à la sensibilisation publique tous azimuts pour l'atteinte de l'objectif "zéro contamination" assigné par le gouvernement.

La lutte contre l'épidémie du VIH/SIDA se veut multisectorielle. A l'occasion de la mise en œuvre de projets qui accompagnent le développement, les campagnes de sensibilisation contribuent à la réduction de l'impact du VIH/SIDA et sont fortement encouragées par le gouvernement. Dans cette approche de lutte de proximité contre les IST-VIH/SIDA le long des projets publics d'infrastructures, où il y a interaction entre les populations, inclure un volet relatif à l'Ebola qui est une maladie à contagion ; transmissible, par contact, sueur, accolade et toutes les sécrétions humaines, ne saurait être un luxe et s'avère absolument nécessaire. Le cas échéant se serait pécher par inattention et/ou omission dommageable.

Les campagnes de sensibilisation contre les IST-SIDA et l'Ebola, dans le cadre de ce projet, s'inscrivent dans cette optique.

3. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

Les objectifs originaux de la Campagne ont fait l'objet d'une révision. En effet, les séances successives de travail que l'ARDPC a eu avec le PRICI durant les phases de négociation du prix de la réalisation de la campagne, et avec ERB sur les objectifs du projet, ont abouti à la révision des objectifs et résultats de la campagne, comme suit :

Objectifs généraux

A travers l'organisation de campagnes de sensibilisation, faire prendre conscience aux employés de l'entreprise retenue pour l'exécution du projet, aux employés des chantiers voisins, aux usagers de la route, aux écoliers, aux populations riveraines de la zone des travaux, aux autorités locales et gouvernementales, aux groupements économiques et aux opérateurs d'activités diverses de la zone d'influence du projet de la nécessité de veiller sur leur santé et de se protéger contre les IST/SIDA et l'EBOLA.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de la campagne sont :

- Concevoir et animer des campagnes de sensibilisation des populations cibles, ainsi que

des acteurs du projet (Ex : écoliers, ouvriers sur les chantiers, etc.).

- Proposer une liste spécifique de groupes cibles pour chacun des thèmes de sensibilisation.
- Créer et installer des comités de lutte contre les IST/SIDA.

Résultats attendus

Les résultats attendus après la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation sont les suivants :

- les populations riveraines du carrefour l'indénié et de la baie de Cocody, habitants des quartiers du Plateau, d'Adjamé et de Cocody, ainsi que les membres du personnel de l'entreprise ERB sont sensibilisés sur les IST-SIDA et la maladie à Virus Ebola ;
- Trois (3) Comités de veille et de lutte contre les IST-SIDA et Ebola sont Créés et installés.

4. ANALYSE DU CONTEXTE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAMPAGNE

Le contexte de la mise en œuvre du projet (la campagne) de sensibilisation a suivi plusieurs étapes qui sont résumés dans le tableau ci-après :

Notification de l'Appel à propositions et Soumission	Début Septembre 2014
Visite d'une délégation de la Mission de Contrôle	24 Septembre 2014
Notification de l'admission de l'ARDPC a l'Appel	Fin Septembre 2014
Echanges et Négociation des prix avec le PRICI et des objectifs avec ERB	Février 2015
Signature avec ERB Décaissement de la première Tranche	31 Aout 2015 15 Septembre 2015
DEROULEMENT DE LA 1ere PHASE DES ACTIVITES	04 Sept – 16 Oct. 2015
Sollicitation de la Seconde Tranche	Mi-Octobre 2015
Attente du décaissement de la 2de Tranche	Octobre 2015 – A CE JOUR
REALISATION DES ACTIVITES RELATIVES A LA 2° TRANCHE	22-26 Février 2016
Rédaction du RAPPORT FINAL Soumission RAPPORT FINAL	Mars 2016 Jeudi 14 Avril 2016

L'appel à propositions pour la campagne de sensibilisation a été lancé en septembre 2014 et le déroulement des activités physiques a débuté en septembre 2015 ; soit 1 an de durée. Cette phase en plus d'avoir été longue, a également été faite d'une communication erratique, rare et non coordonnée. Ce fait a posé un problème de lisibilité du projet, des interlocuteurs et des lignes de responsabilités des acteurs dans le projet.

Comme l'indique le schéma, le début du déroulement des activités a tardé, cela a entraîné par la suite, une modification du chronogramme /timing et l'accélération et accumulation des activités sur une courte période de deux (2) mois au total, au lieu de huit (8) mois, tel que prévu dans les termes de référence initiaux.

Comme l'indique le chronogramme des activités, modifié et joint en annexe, les activités devraient démarrer le 03 septembre 2015. Malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour le démarrage effectif. Cela est dû au retard lié à la passation du marché et au retard de la mise en place des facilités minimums.

L'ARDPC et l'Entreprise ERB ont signé un bon de commande et finalisé la documentation nécessaire au démarrage des activités le 31 Août. Le chèque d'ERB, pour la phase 1, remis à l'ARDPC le 15 septembre 2015, n'a été perçu par l'ARDPC auprès de sa Banque que le 25 septembre. Toutefois, l'ARDPC a préfinancé à ses propres frais les premières activités du projet à partir du 4 septembre, notamment le diagnostic communautaire.

5. PHASE 1 : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES

Le niveau de réalisation physique, de même que le niveau d'atteinte des résultats et cibles des activités de la période sont résumés dans le tableau suivant à la page 8. Les activités ont été programmées dans l'ordre suivant :

(1) Identification des participants à la formation et aux sensibilisations et diagnostic communautaire

Une équipe de l'ARDPC, composée d'un spécialiste VIH-SIDA, éducateur des pairs, Directeur Exécutif de Lumière et Action – de la Chargée de Programmes, mobilisatrice sociale – d'un Conseiller Psychologue et – d'une Assistante, animatrice sociale, a entamé une série de rencontres avec les leaders communautaires le jeudi 10 septembre 2015. Au préalable, une série de courriers ont été envoyés le vendredi 4 septembre à des leaders communautaires identifiés, ainsi qu'aux Directeurs des centres socio-éducatifs de ces quartiers (voir annexe copie de quelques courriers). Le lundi 14 septembre 2015, l'équipe a rencontré le Centre Social de Cocody et la Directrice Régionale Abidjan Lagunes pour une collaboration et une mobilisation des leaders urbains villageois dans le cadre du projet. L'accord de travailler avec nous, ainsi que la liste de tous les leaders communautaires des quartiers d'Adjamé, Cocody et Plateau indénié a été mis à notre disposition à cet effet. Les consultations d'identification, de recueil d'informations, d'échanges et de sélections se sont achevées et un total de 35 leaders communautaires ont été retenus pour le projet (voir liste jointe).

(2) la session d'orientation des Leaders Communautaires/Educateurs des Pairs (EP) qui a suivi s'est déroulée les 25-26 septembre 2015, avec ces 35 leaders communautaires. Après cette session, en fin de la même semaine, s'est tenu, avec le personnel (au moins 35 membres du staff) d'ERB et les **EP (3) La séance de sensibilisation publique.**

6. PHASE 2 : REPRISE DES ACTIVITES

Les activités réalisées lors de la 2^e phase du projet portent sur (4) *La mise en place des comités de lutte et de veille contre les IST-SIDA et la Maladie à Virus Ebola, la distribution de films et CDs, et le suivi-évaluation,*

En effet, après environ 7 mois d'interruption les activités ont finalement repris le 22 février 2016 dernier, avec les contacts et rencontres avec le Centre Social et les Educateurs des Pairs (EP) formés lors de la 1^{ere} phase. Le temps écoulé a permis de réaliser une évaluation significative des EP, s'agissant des aptitudes acquises. Le 26 février, la mise en place de 3 comités de veille, la distribution de CD et film sur le SIDA et Ebola, et l'évaluation des EP se sont déroulés au Centre Social d'Adjamé.

En effet, Dans le rapport à mi-parcours nous avons évoqué un certain nombre d'activités qui restaient à réaliser. Il s'agissait notamment des points suivants :

1. Elaboration des termes de références des comités de veille,
2. Installation des comités de veille,
3. Sélection des films, Projections/diffusion et Echanges débats,
4. Remise de certificats de participation aux EP,
5. Suivi-Evaluation et Rédaction des rapports de fin de projet.

Au total tous les points énumérés ci-dessus ont vu leur réalisation lors de l'atelier organisé le 26 février dernier au centre socio-éducatif d'Adjamé.

7. PLAN DETAILLE D'ACTIVITES

AXE & ACTIVITES	STATUT DE L'ACTIVITE	DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE	RESULTATS DE L'ACTIVITE	AUTRES COMMENTAIRES
IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS ET DES EDUCATEURS DES PAIRS AUX SENSIBILISATIONS ET FORMATIONS				
1. Identification des associations/ structures de jeunes actifs dans la zone	Réalisée	Rencontre des leaders communautaires (LC) des quartiers d'Adjamé, Cocody et Plateau ont été identifiés, de la Directrice des Centres Socio-éducatifs, Abidjan Lagunes, de Cocody et du Directeur du centre Socio-éducatif d'Adjame Santee,	Leaders Communautaires des quartiers d'Adjamé, Cocody et Plateau connus et identifiés	Ces LC serviront de relai auprès des communautés, et sont des Educateurs de Pairs. Certains seront responsabilisés sur les Comités de Veille.
2. Rencontre d'information et d'échange sur les objectifs du projet	Réalisée	Le Centre Social d'Adjamé, a été le lieu de mobilisation et de rencontre entre tous les leaders, grâce à l'appui et du Directeur Mr. Akradji Danho Abraham (voir courriers)	Connaissance accrue du projet par les LC	
3. Définition des critères de sélections des jeunes et travailleurs des sites	Réalisée	L'équipe de projet a eu une série de réunions successives, ainsi qu'avec les centres sociaux afin d'harmoniser les critères de sélection (Age, influence, chefferie, géographie,...) des leaders communautaires et d'associations	Critères de choix des LC définis	
4. Sélection des participants aux sessions de formations	Réalisée	A la suite des rencontres précédentes, une liste de participants a été retenue (voir Annexe)	Participants sélectionnés	
SESSIONS D'ORIENTATION ET DE SENSIBILISATION EN SALLE ET PLEIN AIR				
5. Préparation des courriers et invitation des participants	Réalisée	Des rencontres avec la direction de l'Entreprise ERB (M. SIDI, Prof. GOORE BI et M. BOUAFFO), ainsi que les EP ont permis de s'accorder sur l'heure, le lieu et les modalités de la sensibilisation	Courriers envoyés et rencontres tenues. Les participants ont été mobilisés	Nous avons reçu en plus du matériel confectionnés et achetés, un don de matériels en dépliants et Bactigel gel mains

		plein air et en salle des membres du personnel de l'entreprise		désinfectant) anti-Ebola de l'INHP le 30 septembre 2015. Ce matériel et été utilisé lors de la 2 ^e phase de la campagne
6. Duplication IEC, des fiches d'activités	Réalisée	Des Tee Shirts, banderoles, matériel de sensibilisation et autres IEC ont été produits, utilisés et distribués lors de la session tenue sur le chantier (voir quelques photos)	Matériel IEC et fiches de sensibilisation disponibles en quantité et utilisé pour véhiculer les messages de sensibilisation	Chaque participant a eu droit à un tee-shirt, avec des slogans anti-SIDA et anti-EBOLA
7. Reconnaissance et préparation du site à couvrir	Réalisée	deux visites de la salle pour la projection des films et sur le chantier ont permis d'identifier les lieux de sensibilisation	Sites de sensibilisation plein air identifiés	
8. Séance ouverte de sensibilisation	Réalisée	La session de sensibilisation plein air a été choisie et s'est déroulée avec succès avec environ 70 participants (voir le programme et les photos témoins)	Une Session de sensibilisations plein air tenue	
9. Sélection des films, Projections/diffusion et Echanges débats	Réalisé	Les échanges et débats lors de la séance plein air ont été enrichissants. La salle de l'entreprise ERB étant mal alimentée en électricité, il a été reproduit sur CD les films	3 Films sélectionnés, diffusés et reproduits sur supports	
CREATION ET INSTALLATION DES COMITES DE VEILLE CONTRE LES IST-SIDA ET L'EBOLA				
10. Elaboration des termes de références du comité	Réalisé	L'Equipe du projet a travaillé à l'élaboration des termes de référence du Comité de Veille Anti IST-SIDA et Ebola (CVAISE)	Les TDR à termes permettront de donner une direction aux CVAISE	
11. Sélection des membres du comité	Réalisé	Les membres du CVAISE sont choisis sur la base du volontariat et de leurs capacités acquises parmi les EP	Les membres sont sélectionnés à terme	

12. Elaboration du plan d'action du comité	Réalisé	L'Equipe du projet a travaillé à l'élaboration du Plan d'Action du Comité de Veille Anti IST-SIDA et Ebola (CVAISE) (voir annexe)	Un contenu d'actions et d'activités est fourni au CVAISE	
13. Cérémonie d'installation des comités de veille et remise des parchemins	Réalisé	Une cérémonie solennelle a été organisée au Centre Social d'Adjamé qui a permis la création et l'installation des 3 CVAISE	Les CVAISE sont créés et installés	Institutionnalisation, pérennisation et durabilité du projet assurées
ACTIVITES DE SUIVI-EVALUATION DU PROJET				
14. Rédaction des rapports de fin de projet	Réalisé	Les rapports à mi-parcours sont élaborés. Les rapports finaux sont soumis.	Les Rapports de lancement, à mi-parcours et finaux sont élaborés	
15. Suivi du projet	Réalisé	Le suivi du projet a démarré avec les indicateurs que nous avons renseignés. (voir annexe)	La mise en œuvre du projet est réussie	
16. Evaluation du projet	Réalisé	L'Evaluation préliminaire est faite et a permis de mesurer le degré d'atteinte des résultats fixés.(voir annexe)	Le projet a été suivi et évalué de manière satisfaisante	

8. PLAN DE SUIVI-EVALUATION ET PERFORMANCE DU PROJET

OBJECTIFS SPECIFIQUES	STRATEGIES	ETAPES	INDICATEUR	CHARGE	PRODUIT	EFFET	IMPACT
<i>Obj 1 : D'ici la fin du projet, contribuer à l'amélioration des connaissances sur les IST/VIH/sida chez les jeunes de 15 à 24 ans dans la zone d'influence ;</i>	Promouvoir l'éducation par les pairs	Identification des jeunes et travailleurs participants aux formations	Nombre de personnes identifiées et formées.	Plateforme PVE	25 personnes formées (au total 35 personnes formées –voir liste signature P35) - +100%	Suite à l'évaluation en salle, 30 personnes ont bien maîtrisé les cours ; soit 88%	Les comportements ont changé. Aucun participant n'a été déclaré atteint d'Ebola (100%). Mais pour les IST et SIDA seul le Test peut aider à mesurer s'ils sont atteints et voir l'impact de la campagne sur changement de comportement. Ce volet n'est pas inclus dans le projet
		Organisation des sessions de formations/ séances d'orientation sur les IST/VIH	Nombre de sessions de formations tenues		2 sessions de formation organisée (100% - voir images)	Plus de 88% maîtrisent les cours	Pas de contamination SIDA/Ebola liés aux travaux de chantier d'ERB notée.
		Création de comité de lutte contre le VIH et Ebola	Nombre de comités créés		3 comités de lutte créés (100%)	information accrue Sida, Ebola	Changement de comportement constaté dans les zones d'Adjamé, Cocody, Plateaux, riveraines
<i>Obj 2 : D'ici fin du projet, amener les Participants à adopter des Comportements à moindre risques face aux IST/sida et Ebola</i>	Organiser des séances de communication pour le changement de comportement	Organisation de séance de sensibilisation de proximité	Nombre de personnes sensibilisées.	Plateforme PVE	2 Séances de sensibilisation tenues (100%)	en salle et sur le chantier. 90% Connaissance accrue,	Changement de comportement constaté dans les zones d'Adjamé, Cocody, Plateaux, riveraines du projet ERB (environ 100 personnes)
		Projection de film suivie d'échanges sur le VIH et Ebola	Nombre de séance de projection réalisé		2 séances de projection réalisée (100%)	En salle. Connaissance accrue,	Sur le chantier pour manque d'électricité, les explications des spécialistes ont remplacé le film. Changement de comportement
<i>Obj 3 : D'ici la fin du projet, contribuer à l'amélioration des connaissances de la population cible sur l'épidémie d'Ebola</i>	Organiser des séances de communication pour le changement de comportement	Organisation de séance de sensibilisation de proximité	Nombre de personnes sensibilisées.	Plateforme PVE	2 séances de Sensibilisation tenues	Idem Sensibilisation ci-dessus	Idem Sensibilisation plus haut. Les comportements ont changé vis-à-vis d'Ebola et des IST/SIDA
		Projection de film suivie d'échanges sur l'Ebola	Nombre de séance de projection réalisé		2 séances de projection tenues (idem)	Idem projection ci-dessus	Idem projection ci-dessus

II. VOLET FINANCIER

9. NOTE INTRODUCTIVE

Les dépenses ont été effectuées en fonction du cadre budgétaire. Les lignes sont en accord avec celles définies dans le cadre logique.

Seulement dans l'implémentation (la mise en œuvre) les activités pour lesquelles, le montant alloué s'est trouvé insuffisant, un ajustement des montants avec les autres activités dans le même axe a été fait. Il s'agit, par exemple, des activités préparatoires à la session d'orientation qui n'avaient pas été budgétisés. Toutefois, les lignes des axes se sont compensées.

Ce point financier va présenter le tableau du suivi budgétaire.

10. CADRE DE RENDEMENT / RAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER



Alliance pour la
Reconstruction et le
Développement
Post
Conflit



E.R.B
Entreprise Routes & Bâtiments
Curage et Fauçardage sous eau



Alliance pour le Développement (ARDPC)

Numéro
du Fonds: D-2

**Campagne de Sensibilisation contre les IST-SIDA et la maladie a
Virus Ebola a l'Indénié, Baie de Cocody, Abidjan**

Montant total : **4 985 000**

Montant
reçu: **4 237 250**

Transformer les Vies et les Nations

Ligne budgétaire	Description des dépenses						Budget (B) (FCFA)	1e Versement (V) (FCFA)	Dépenses (D) (FCFA)	Variance 1er V (V-D) (FCFA)	Variance B (B-D) (FCFA)
	Notes										
1. Identification des Participants aux Formations											
Identification des Associations/ Structures de la zone							100 000	100 000	100 000	0	0
Rencontre d'information et d'échange sur le projet							100 000	100 000	100 000	0	0
Définition des critères de sélection des jeunes et leaders							150 000	150 000	150 000	0	0
Sélection des participants aux formations							150 000	150 000	150 000	0	0
2. Session d'Orientation sur les IST-SIDA et Ebola											
Activités préparatoires de la Session										0	0
Tenue de la Session											
Transport des participants							225 000	225 000	225 000	0	0
Location de la salle							60 000	60 000	60 000	0	0
Kit d'orientation (Cahier et matériel)							33 750	33 750	33 750	0	0
Manuel d'orientation du Participant							63 750	63 750	63 750	0	0
Restauration							405 000	405 000	405 000	0	0
Honoraire des EP / Personne Ressource							200 000	200 000	200 000	0	0
Divers (Diplôme,...)							12 500	0	12 500	-12 500	0
3. Sessions de Sensibilisation en Salle et Plein Air											
Préparation des courriers et invitation des participants							100 000	100 000	100 000	0	0

Duplication et Acquisitions des fiches d'activités							100 000	100 000	100 000	0	0
Reconnaissance et préparation du site à couvrir							50 000	50 000	50 000	0	0
Séance ouverte de sensibilisation et Echanges et Débats							600 000	600 000	600 000	0	0
Production Films, Distribution, Diffusion							150 000	0	150 000	-150 000	0
4. Comites de Veille contre les IST-SIDA et EBOLA											
Elaboration des termes de références du comité							50 000	0	50 000	-50 000	0
Sélection des membres du comité							100 000	0	100 000	-100 000	0
Elaboration du plan d'action du comité							50 000	0	50 000	-50 000	0
Cérémonie d'installation des comités de veille							120 000	0	120 000	-120 000	0
5. Administration et Suivi-Evaluation du Projet											
Suivi-Evaluation du Projet							500 000	425 000	500 000	-75 000	0
Indemnités de l'Equipe du Projet							565 000	500 000	565 000	-65 000	0
Fonctionnement du Projet							500 000	425 000	500 000	-75 000	0
Frais de gestion, Administration et Imprévus							600 000	549 750	600 000	-50 250	0
Somme:							4 985 000	4 237 250	4 985 000	-747 750	0

Reçu d'ERB:	4 237 250
Dépenses totales effectuées :	<u>4 985 000</u>
Solde des fonds reçus ou Avance Travaux:	<u>0,00</u>
Solde du Financement totale (A Payer par ERB):	<u>747 750,00</u>

Soumis

ADJIMANI Marina, Comptabilité et Finance ARDPC

Date: 14/04/2016

Approuvé

Michel SARAKA, Directeur Exécutif ARDPC

Date: 14/04/2016

Nota Bene :

Le budget a été bien exécuté et il n'y a eu aucun cas de dépassements, surtout que le projet était de petite taille. Les Pièces Justificatives seront fournies sur demande. **Voir Facture pour paiement de la 2^{nde} tranche jointe en attente.**

11. FACTURE A PAYER PAR ERB



Alliance pour la
Reconstruction et le
Développement
Post
Conflit
Transformer les vies et les nations

FACTURE

Adresse 2 Plateaux Kratos, 01 BP 10 004 Abidjan 01
Ville, Etat, Tel/Cel Abidjan, Cote d'Ivoire, (225) 2241 0818/ 5668 5407/ 7733 0258

SERVICE FOURNI : **Campagne de Sensibilisation Contre le VIH-SIDA et EBOLA**

Nom/Lieu Abidjan
Adresse Corniche / Baie de Cocody
Ville, Etat, Tel/Cel Abidjan/Cote d'Ivoire

NUMERO FACTURE F001/ERB/2015
DATE FACTURE avril 13, 2016
NOTRE ORDRE NO. NO-01
VOTRE ORDRE NO. VO-01
TERMS Fac Transfert
REPR M Ahmed Sidi Mohamed
TYPE CONTACT Telephone et mail
F.O.B. n/a
PAY Comptable

DEMANDEUR: **L'ENTREPRISE ROUTE ET BATIMENT**
COTE D'IVOIRE, « ERB CI »
Palazzo Posilopo 2e étage, Porte 20
30 BP 1011 Abidjan 30, Danga, Cocody, Abidjan
Tel: (225) 2248 0628/ 7750 5878/ 5805 9677

Taux Service :

Brut

QTITE/JOUR	DESCRIPTION	PRIX UNITE	MONTANT (CFA)
1	Campagne de Sensibilisation contre le VIH-SIDA et l'EBOLA (Voir detail offre technique et financiere)	4 985 000,00	4 985 000,00
	RELIQUAT (15% du total) a la livraison des rapports	0,15	747 750,00
	TOTAL SERVICE		4 985 000,00
	AVANCE		0,00
	RELIQUAT		747 750,00

POUR INFORMATIONS:
Saraka Kouame Michel
Directeur Executif, ARDPC
(225) 5668 5407/ 7733 0258
email: michelsaraka@gmail.com

Attn: Directeur ERB, Ahmed Sidi M,
Adresse erbci2014@yahoo.fr
Ville, Pays Abidjan, Cote d'Ivoire

Merci pour la sollicitation

PAYER CE
MONTANT RESTANT

12. DIFFICULTES RENCONTREES

- La lenteur d'exécution, qui a occasionné le décollage tardif du projet,
- la définition floue des responsabilités dans le projet,
- l'accumulation des activités sur un (1) mois, rendant difficile son exécution,
- le paiement par chèque barré et l'avis de l'entreprise avant exécution de la Banque, ont entraînés un rallongement de 10j pour le paiement du chèque,
- le faible intérêt apparent pour le projet.

13. RECOMMANDATIONS

- ✓ Payer la 2nde tranche (747 750 F CFA) par chèque non barré directement touchable par l'ARDPC aux guichets de la Banque, du fait du préfinancement (factures, paiements),
- ✓ Revaloriser et faire comprendre aux acteurs l'importance de la prise en compte sociale et environnementale dans un projet pareille dans une zone à forte densité humaine

14. CONCLUSION

Malgré le retard dû à la finalisation tardive des termes de la collaboration entre l'Entreprise ERB, le PRICI et l'ARDPC, la Campagne de Sensibilisation contre le VIH SIDA et l'EBOLA, dans le cadre des activités du Projet d'urgence de renaissance des Infrastructures en Côte d'Ivoire (PRICI), notamment en sa composante IV (Assainissement eaux usées) qui concerne les travaux de renforcement des ouvrages de drainage au carrefour de l'Indénié et d'aménagement de la baie de Cocody, a effectivement démarré le jeudi 10 septembre 2015 et s'est achevé le 26 février 2016.

Les activités ont gagné en intensité et en visibilité depuis fin septembre 2015, avec la séance de sensibilisation plein air, sur le terrain du chantier.

Les activités ont été bien conduites, malgré le manque apparent d'intérêt pour le projet et ses conséquences inhérentes. Les axes programmatiques ont été respectés. Le projet a eu un impact significatif sur les populations riveraines et les employés d'ERB, qui ont formulé le vœu de participer à plusieurs autres campagnes de l'ARDPC.

Les activités de la deuxième phase qui devaient se déroulés en fin octobre 2015 ont finalement eu lieu le 26 février 2016. Ce retard est dû au manque de fonds et l'ARDPC a pris un crédit pour finaliser le projet en attendant le paiement par ERB de la 2^{ème} tranche (747 750 FCFA).

L'ARDPC souhaite poursuivre sa collaboration avec ERB et le PRICI, dans le cadre de d'autres projets de sensibilisation en CI et dans la sous-région encore plus structurés, eu égard à son expérience régionale. Sur bien d'autres thématiques majeures de développement et les questions de renforcement des capacités, l'ARDPC dispose des capacités pour accompagner les projets et programmes de développement d'ERB, et du PRICI afin de les aider à accumuler des valeurs ajoutées et richesses encore plus importante.

La prospérité d'ERB dépend aussi de la connaissance, du savoir, et du bon traitement de ses employés ; c'est ce que l'ARDPC offre le mieux.

Nous remercions la Banque Mondiale, le PRICI, et ERB qui nous ont fait confiance.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

15. ANNEXES

Séances de Mobilisation Communautaire et Sessions / Réunions préparatoires de la Plateforme PVE



Michel SARAKA, Expert Economiste,
Directeur Exécutif de l'OSC ARDPC,
Coordonnateur de la Campagne



Franck BONI, Directeur Exécutif de
l'ONG Lumière Action, Partenaire
Technique VIH-SIDA de l'ARDPC



Une vue de la rencontre/ séance d'échange préliminaires
avec quelques Leaders Communautaires et Pairs

*




Session d'Orientation / Formation des Leaders Communautaires et des Pairs Educateurs (EP)



Une photo de groupe seulement avec les Leaders Communautaires lors de l'atelier d'Orientation / Formation



Une vue de la salle de LA Session d'orientation avec l'Expert sur les IST-SIDA, BONI Franck et les participants

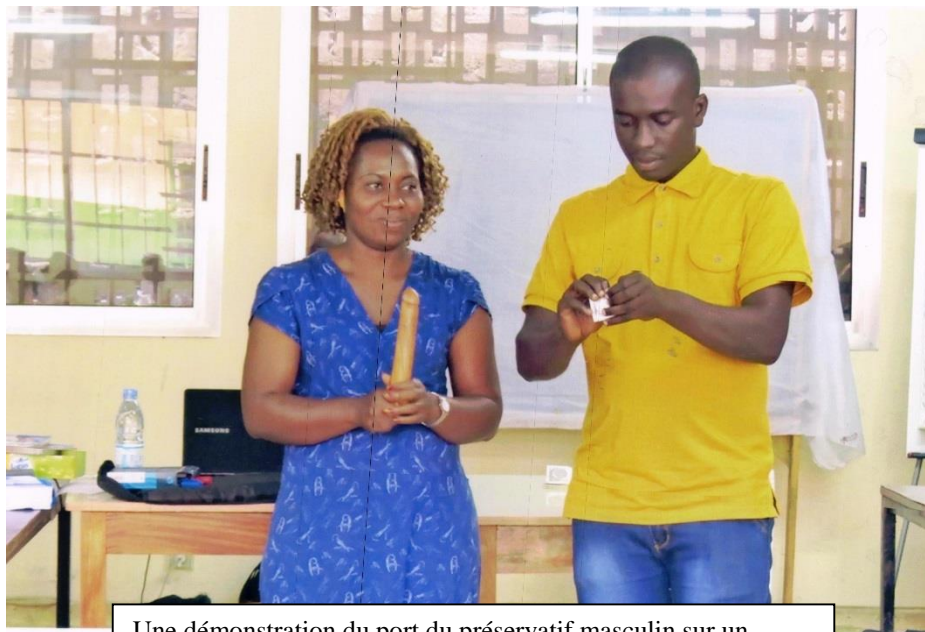

Une démonstration du port du préservatif masculin sur un pénis-model, comme mode de prévention contre les IST-SIDA.

Session sur la maladie a Virus Ebola



Dr. PhD. Kouame KOUADIO, Virologue, Enseignant Chercheur, a l'IUA et Expert a l'Institut Pasteur en pleine diffusion des connaissances sur l'Ebola et le SIDA



Intervention de Michel SARAKA lors de la formation. Dr. Kouadio en attente de son temps d'intervention.



Le Directeur Exécutif de l'Alliance pour le Développement (ARDPC), Mr. Michel K. SARAKA procède à une démonstration sur les participants d'une des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Il s'agit de l'hygiène des mains, par le nettoyage rapide sans eau, sans savon et sans rinçage, grâce au gel antibactérien désinfectant.



Mr. Alain KRA, Expert VIH, Discrimination et Droits Humains, Membre du COS-CI dont les conseils et interventions ont fort instruis les participants pour une meilleure orientation.




La Directrice du Centre Social D'Adjamé au lancement de la Formation, Mme OUATTARA



Le Directeur du Centre Socio-Educatif D'Adjamé, Mr AKRADJI Danho

Nos infinis remerciements à ces 2 autorités du Centre Social d'Adjamé Santé pour leur appui diligent et appréciable, sans lequel, le projet aurait connu des difficultés dans son déploiement sur le terrain.

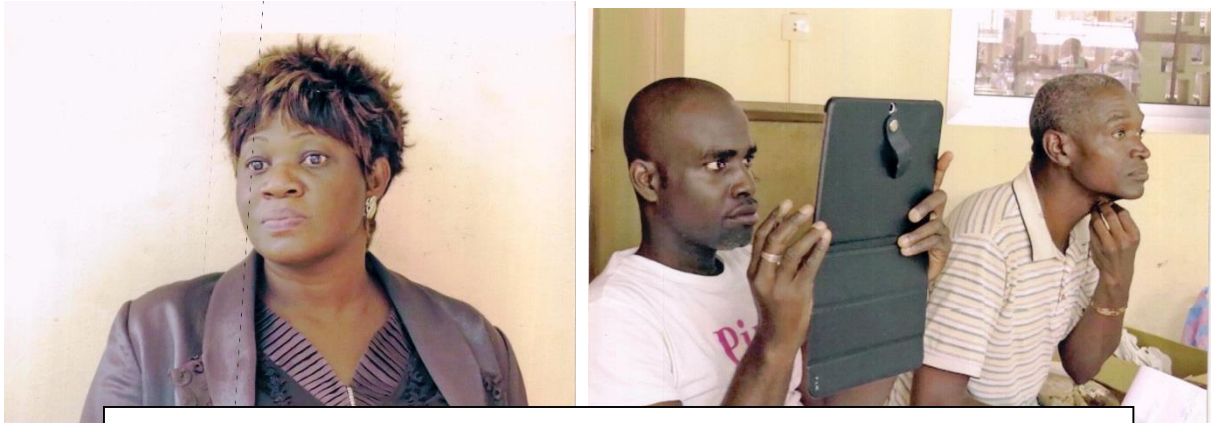

De gauche à Droite Mme Grah Monique, Directrice de Programmes à l'ARDPC, Mr. GOA et Mr. Bamba du PRICI, en bas Mr. GUEU Environnementaliste de la Mission de Contrôle





Une vue de la foule des participants à la Sensibilisation Plein Air sur le chantier ERB, Baie de Cocody, Corniche



Professeur GOORE BI, Représentant du Directeur d'ERB prononçant le Discours d'Ouverture et de lancement de la Sensibilisation Plein Air



Le Directeur Exécutif de l'ARDPC faisant son Discours, après le mot de bienvenue du Directeur de Lumière Action à droite, Partenaire et Membre de la Plateforme contre les VIH-IST et Ebola (PVE)



Mr. AKREDJI Danho, Directeur du Centre Social d'Adjame, lors de son Discours, a ERB



Une vue des participants à la sensibilisation à ERB



Deux (2) employés d'ERB partageant leurs expériences en vue d'obtenir des réponses à leurs inquiétudes sur les IST-SIDA et l'Ebola



Une vue du parterre de Leaders Communautaires et des employés ERB lors de la sensibilisation sur le chantier d'ERB a la Corniche, Baie de Cocody



Une démonstration du port de préservatif masculin et Féminin par les employés d'ERB avec l'aide des Animateurs Communautaires de l'ARDPC lors de la sensibilisation






Séance de démonstration du port de préservatif féminin



Une équipe de l'ARDPC en pleine préparation et démonstration du lavage des mains pour montrer comment se prévenir contre la maladie à virus Ebola par le lavage des mains du Dr. PhD. Kouame Kouadio. Chantier ERB, Corniche, Cocody, Abidjan, Septembre 2015



PHOTOS DES ACTIVITES DE LA SECONDE ET DERNIERE PHASE
 (Février – Avril 2016)





Dès signature du contrat et Réception 1^{er} versement (Semaine 1 : du 01 et 02 Septembre 2015)

Activités	Dates													
	Semaine 1 03 au 06/9		Semaine 2 07 au 13/9		Semaine 3 14 au 20/9		Semaine 4 21 au 27/9		Semaine 5 28/9 au 4/10		Sem. 6 5 au 11/10		Sem. 7 12 au 18/10	
1. Identification des participants aux Comités locaux														
Identification des associations/structures de jeunes actifs dans la zone														
Rencontre d'information et d'échange sur les objectifs du projet														
Définition des critères de sélections des jeunes et travailleurs des sites														
Sélection des participants et sessions d'orientation / Briefing														
2. Organisation de séance de sensibilisation														
Préparation des courriers et invitation des participants														
Duplication des fiches d'activités														
Reconnaissance et préparation du site à couvrir														
Séance ouverte de sensibilisation														
Sélection des films, Projections/diffusion et Echanges débats														
3. Création de comité de lutte contre le VIH et Ebola														
Elaboration des termes de références du comité														
Sélection des membres du comité														
Elaboration du plan d'action du comité														
Installation de 3 Comités de Veille														
4- Activités de fin de projet														
Rapports de fin de projet														
Evaluation du projet														
Suivi du projet														
Dépôt du Rapport PRICI, ERB														

CHRONOGRAMME D'EXECUTION EFFECTIF DU PROJET

Activités	Dates													
	Sept. 2015 14 au 20/9		Sept 2015 21 au 27/9		Sep-Oct 15 28/9 a 4/10		Feb 2016 22 au 28/2		Mars 2016 01/3 au 13/3		Mars 2016 14 au 31/3		Avril 2016 01 au 14/4	
1. Identification des participants aux Comités locaux														
Identification des associations/structures de jeunes actifs dans la zone														
Rencontre d'information et d'échange sur les objectifs du projet														
Définition des critères de sélections des jeunes et travailleurs des sites														
Sélection des participants et sessions d'orientation / Briefing														
2. Organisation de séance de sensibilisation														
Préparation des courriers et invitation des participants														
Duplication des fiches d'activités														
Reconnaissance et préparation du site à couvrir														
Séance ouverte de sensibilisation														
Sélection des films, Projections/diffusion et Echanges débats														
3. Création de comité de lutte contre le VIH et Ebola														
Elaboration des termes de références du comité														
Sélection des membres du comité														
Elaboration du plan d'action du comité														
Installation de Comités de Veille														
4- Activités de fin de projet														
Rapports de fin de projet														
Evaluation du projet														
Suivi du projet														
Dépôt du Rapport PRICI, ERB														

Quelques noms des Leaders Communautaires présents*(Voir liste des signatures pour la liste complète)***Mobilisation des leaders communautaires pour la sensibilisation et la lutte contre le VIH /SIDA et la fièvre hémorragique à virus d'Ebola dans les Communes d'Adjamé, Plateau, Cocody**

N°	Nom et Prénoms	Structure Région d'origine	Fonction	Contacts
01	Baflan Tiémoko Jean	Guemon	Chef central des Wê	06659208 03601187
02	Tiémoko Henri	Tonkpi	Chef Dan Yacouba	05540389
03	Iman Cissé Aboubakar Sidi	Chef du quartier Dallas	Iman Chef Dallas	08605615 45040485
04	Iman DossoMamadou	Mosquée CEDRISS Mairie I	Iman Quartier rouge	07836373
05	N'doli Kouadio	Communauté Agni Quartier Bracodi	Chef Agni Bracodi	66318237
06	Traoré Zoumana	Chef Malinké Mairie I, II	Chef Communautaire	08476256
07	Dago Marc	Quartier KM Résidence du quartier centre	Chef de quartier Plateau centre	05773885 48846277
08	N'gboba Simon	Chef des Chefs Atchan	Chef d'Adjamé village Ebrié	07690065
09	Voir David	Plateau quartier Résident port-douanier	Chef des Résidents	
10	Le Réverand Pst Eglise AD Dallas	Assemblees de Dieu de	Pasteur centre	Voir le Diacre
11	Amien Remi	Communauté Attié d'Adjamé	Chef Attié	45258941
12	Officier à la retraite	Résident Rane 40lgts Plateau	Chef du quartier. Voir Adjt chef Mme Kouamé Yolande	05092696
13	Traoré Djibril	Grde Mosquée centrale d'Adjamé substitut de l'Iman	Gestionnaire de la grde Mosquée	
14	Le Révérand Père Supérieur Solomon	Eglise Catholique Saint Michiel d'Adjamé	Prêtre Aumonier	
15	Adou Julienne	AUEC Espoir	Leader des femmes quartier rouge	06923146
16	Diawara Mariam	Quartier Adjamé Dallas	Leader des femmes AUEC-Avenir et RDR	66958430 04966798
17	Ismael Traoré	Mosquée Afwa	Iman	05703516
18	Diaby Baba	Inspection de l'enseigne- ment secondaire (IES)	Conseiller Municipal à Adjamé	09483559 02621302
19	Coulibaly Kouaonan	Poro	Chef des sénoufo d'Adjamé	05232300

Liste des signatures Session d'orientation / Formation



Alliance pour la Reconstruction et le Développement
ARDC
Crise
Conflit



SOCIETE FADOL RAVACY COTE D'IVOIRE
LEADER DE LA TECHNIQUE DE CONSTRUCTION



Transformer les Vies et les Nations
Plateforme contre le VIH-SIDA et l'Ebola (PVE)

Objet : Formation des leaders communautaires/EP contre le VIH-SIDA et Ebola
Date : 26/09/2015

Frais de Transport

Lieu : Centre Social Adjame

N°	NOM ET PRENOMS	STRUCTURE	FONCTION	CONTACT/EMAIL	MONTANT	EMMARGEMENT
1	Kamoussa B	PRICI	Coordinateur		5000 F	
2	dean Koko C	Association	Regional	07-78-57-00	5000 F	
3	BOA Jean Louis	PRICI	Coordinateur	07-56-60-23	5000 F	
4	Kiba Sully Kani				5000 F	
5	Kouadio A	ARDC	Psychologue	07-15-71-23	5000 F	
6	Sawaouko B	Chercheur			5000 F	
7	AKBANTI	Comité S	Directeur	05-11-4-59	5000 F	
8	Ahou Gado				5000 F	
9	Netteko				5000 F	
10	Abou Ouhé				5000 F	
11	BATI A				5000 F	
12	Barki AKA				5000 F	
13	Ahou Abouba				5000 F	
14	Kouassi Alain				5000 F	
15	Ahou Walyan				5000 F	
16	ESSANI ESSANI				5000 F	
17	NESSO Waly Zola				5000 F	
18	IRBANI Mahala				5000 F	
19	ABAI Ange				5000 F	
20	QUE TIENKA				5000 F	
21	NORRE Gustave				5000 F	
22	Abali Kouadio				5000 F	
23	Koualy Zouk				5000 F	
24	Rouet Bi IAH				5000 F	
25	MOUSSI TAH				5000 F	
26	TIEKOLO				5000 F	
27	Amadou Beugre				5000 F	
28	Abou Ali				5000 F	
29	Abou Kouadio				5000 F	
30	Bonifance				5000 F	
31	Kouadio HIAN				5000 F	
32	Kouadio				5000 F	
33	Abou HIAN				5000 F	
34	Abou HIAN				5000 F	
35	Abou HIAN				5000 F	
36						
37						
38						
39						

Brouxak
